

MOTICONCI
movimiento de tierra y construcciones civiles

Portoviejo, 5 de Abril del 2011

0 0 5 11 2011

Señores Socios
MOTICONCI CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía, y en cumplimiento de la ley y de los estatutos dictados en la constitución de la compañía, presento el informe de labores del período de Enero a Diciembre del 2010.


Presento a ustedes un informe detallado de las actividades realizadas por la empresa, comenzando por las obras que estaban en ejecución desde el año anterior y que concluyeron en este período las mismas que a continuación detallo:


OBRAS CONCLUIDAS:

En este año se concluyó las siguientes obras:

1. Construcción del Camino Vecinal – La Elvira-Las Gilces de la parroquia Crucita, con recepción Definitiva del 2 de febrero del 2010.
2. Se terminó el 4 de febrero del 2010 la construcción de la Red de Distribución del sistema integral de agua potable en el subsector No. 8.2 de la ciudad de Jipijapa, contratada en Septiembre 9 del 2009, por un monto de \$ 581.598,46 se presentaron cinco planillas por un monto total de \$ 618,539,44 quedando valores pendientes de pago de planillas 3,4, y planilla adicional por un valor de \$ 112.126,96
3. - Se terminó la Construcción del Ramal Norte de la Línea de Transmisión de la Red de Distribución del sistema integral de agua potable de la ciudad de Jipijapa, obra que fue contratada con la Junta de Recursos, por un monto de \$ 973.196,66, la y terminada el 28 de mayo del 2010 y a pesar de haber solicitado la recepción provisional de la obra en la misma fecha no se la pudo firmar el año 2010 por problemas internos de la J.R.H. el total planillado en la obra fue de \$ 846.118,48 dando un valor menor al contratado. Los valores que están pendiente de pagos suman \$ 126.816,87 y hay que amortizar por anticipo un valor de \$ 122.521,92.

Dir. Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio
Telfs. 2633407/2653832
Fax. 2632731 - E-mail: moticonci@mundonet.ec

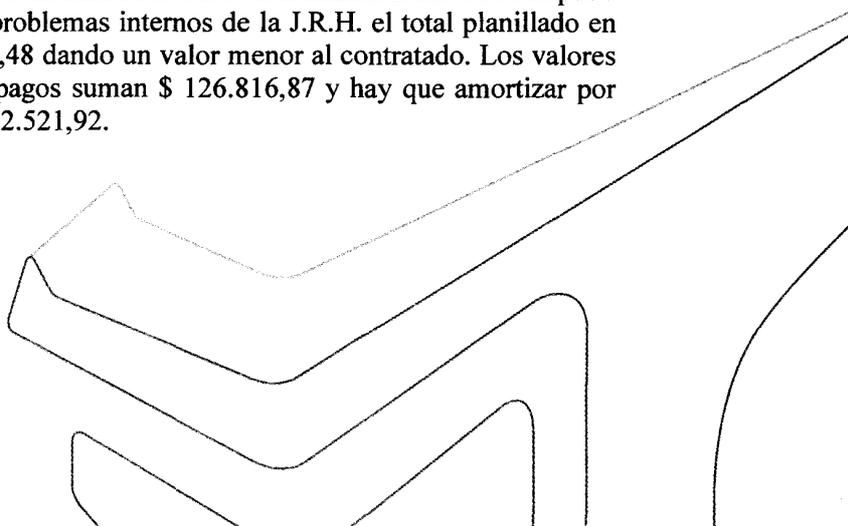



MOTICONCI
movimiento de tierra y construcciones civiles

OBRAS CONTRATADAS:

08 JUN 2011

Al momento hemos contratado las siguientes obras

1. Se contrató con el Consejo Provincial de Manab' el Mantenimiento y Rehabilitación de varios tramos de la V'a Jipijapa- Noboa, el 15 de Octubre del 2010, por un monto de 749.999,22, del cual se entregó el 70% de anticipo el mismo que fue entregado de la siguiente forma el 40% por un monto de (\$ 299.799,69) a la firma del contrato el 22 de Octubre del 2010 y el 30% después de 30 d'as de entrega del anticipo. Valor que fue entregado el 02 de diciembre de 2010 la obra se encuentra con un avance del 60.92% habiéndose presentado planillas por avance de obra No. 1 y 2, por un monto \$ 456.887,90, las mismas que se encuentran pagadas en la actualidad.

Sobre este mismo contrato, se firmó con fecha 18 de febrero del 2011, un contrato complementario por incrementos de rubros, por un plazo de 60 d'as.

También se continuó contratando con la empresa CONECCEL en los siguientes proyectos:


Construcciones de Radio Base en varios sitios por un monto total de \$ 258.016.72

Además se dio en alquiler las maquinarias y transporte que tiene la compañía a empresas Privadas como el consorcio Conmaport, Juvive Constructora S.A., Dolitad S.A., Granja Laurita, Consorcio Grupo Inmobiliario.

La empresa ha adquirido en este año los siguientes Activos Fijos:

- 1 Rodillo Liso Vibratorio marca Volvo
- 1 Camioneta FORD F150 4x2
- 1 Camioneta Volkswagen Amarok 4x4 la cual remplaza a la camioneta Toyota Hilux 4*4 que fue vendida en \$ 5000,00
- 1 GPS map 60CSX
- 1 Computadora estacionaria para Servidor Windows
- 1 UPS de 900VA marca CDP con regulador de voltaje triplite de 1000
- 1 Impresora Canon multifunción MX 320
- 1 Impresora Canon MX320
- 1 Butaca triple pasión
- 4 sillas Tentaciones
- 2 sillas pilot c/ brazos

Atentamente,


Ing. Walter Cedeño Guillén
GERENTE GENERAL

Dir. Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio
Telfs. 2633407/2653832
Fax. 2632731 - E-mail: moticonci@mundonet.ec

