

MOTICONCI
movimiento de tierra y construcciones civiles

Portoviejo, 4 de Abril del 2008

Señores Socios
MOTICONCI CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía, y en cumplimiento de la ley y de los estatutos dictados en la constitución de la compañía, presento el informe de labores del período de Enero a Diciembre del 2007.

OBRAS CONTRATADAS

Como se indicó el año anterior respecto a los contratos firmados informo el estado de los mismos:

A principio del año 2007 la empresa EMAPAP, cancela las planillas de trabajos realizados en años anteriores en la Laguna de oxidación y alcantarillado sanitario y fluvial de varias calles de Portoviejo.

Además se realizaron las Actas definitivas de las siguientes obras contratadas el año 2006:


Construcción del Alcantarillado Sanitario del paso lateral, sublínea derecha, sector 2, ésta obra se encuentra concluida y recibida definitivamente con fecha 4 de junio del 2007, y pagada en su totalidad (plan.No.3 y adicional) el 17 de abril del 2007.

Construcción del Alcantarillado Sanitario prolongación Av. Reales Tamarindo desde la calle Ferroviaria hasta paso lateral, recibida definitivamente el 26 de sept. 2007, pagada el año 2006.

Colocación de carpeta asfáltica en la calle Portoviejo desde la Vía Bahía-Charapotó hasta la calle Quito y en la calle Pública hasta la calle Portoviejo del balneario San Jacinto de la parroquia Charapotó, obra terminada en el plazo establecido, y entregada definitivamente el 21 de agosto del 2007, pagada en dos partes, un abono el 23 de enero del 2007 y el saldo en noviembre del mismo año.

Reconstrucción de los canales de riego del proyecto Poza Honda margen Izquierda, lote 04, perfil abierto, L= 350M, abscisas 4+464 - 4+814, recibida provisionalmente el 25 de enero del 2007 y definitivamente el 9 de agosto del 2007, a inicio de año se pagó la planilla adicional No.1, faltando por cancelar la planilla normal No.2, por el valor de \$15.233,36.

Dir. Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio
Telfs. 2633407/2653832
Fax. 2632731 - E-mail: moticonci@mundonet.ec

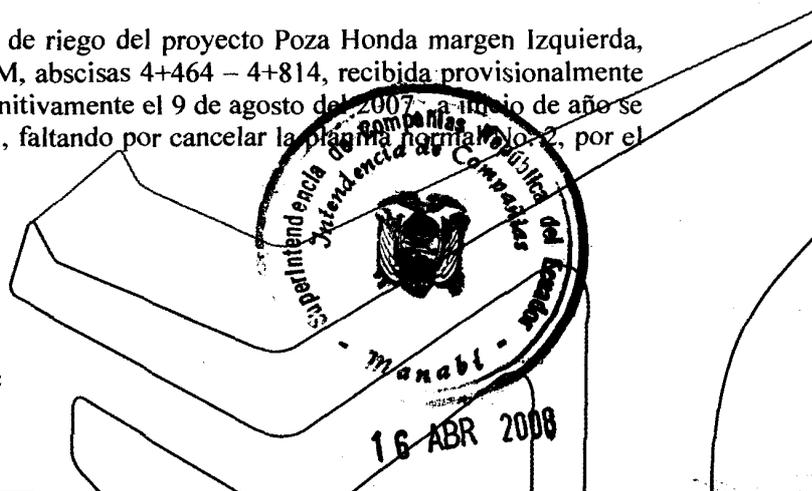



MOTICONCI
movimiento de tierra y construcciones civiles

OBRA EN EJECUCION:

Como es de conocimiento de todos los socios, a finales del año 2006, se participó con Corpecuador para el Encauzamiento de la Quebrada Fanca II, ganando el concurso el cual se lo adjudicaron el 10 de octubre del 2006 por el monto de \$ 617.093,83 y un plazo de 6 meses, dichos trabajos se iniciaron el 2 de diciembre del mismo año sin recibir el anticipo de la obra, teniendo que paralizar el 12 de diciembre del 2006 por motivos de problemas surgidos por la expropiación de los terrenos donde está el proyecto.

En el mes de Diciembre del 2007, se recibe el anticipo de la obra, previo la firma de un adendum que cambia el porcentaje del anticipo indicado en el contrato, en la actualidad estos trabajos se encuentran paralizados debido al invierno y ala falta de un contrato complementario, esperando iniciar los trabajos el mes de mayo del 2008, por lo pronto se ha adquirido los materiales con el anticipo recibido.

Además la empresa en el año 2007 mantuvo ingresos por el alquiler de maquinarias a empresas Públicas como el Municipio de Sucre, Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la ejecución de la sede de la Asamblea, y a empresas Privadas, cuyos ingresos se reflejan en el balance.

BIENES ADQUIRIDOS.

La empresa ha adquirido en este año los siguientes Activos Fijos:

En Enero del 2007 una Excavadora 324DL por un monto de \$180.000 más iva, financiado por CAT. FINANCIAL, a 24 meses.

En febrero del 2007 un vibrador wacker M2000, a bagant Cia. Ltda..1.752.30 + iva.

Un escritorio ejecutivo, sillón presidente y una mesa de sesiones \$880 + iva.

Una computadora pentim 4.

Un minicargador 246B

Modular 6 puertas y 12 gavetas dept. contabilidad

Un escritorio en L. Dept. de contabilidad.

Aires acondicionados split.

Teodolito automático marca Kern.

Biblioteca modular

2 butaca fijas

1 sillón giratorio

Estantería metálica

Central telefónica

Atentamente,

MOTICONCI Cia. Ltda.
RUC: 130098213007
Ing. Haroldo Parraga Mejía
GERENTE GENERAL

Dir. Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio
Telfs. 2633407/2653832
Fax. 2632731 - E-mail: moticonci@mundonet.ec

